

OK E. Mata
Aprobado informe
Presupuesto y Financiero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1 ANTECEDENTES

Numero de informe: Informe #2
 Numero de proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/62
 Titulo de organización: Asociación avancemos
 Director del proyecto o responsable: Olga Chavarria Rodríguez
 Dirección de la organización: La Palma barrio Guadalupe
 Teléfono: 21351270/2735 1218
 Fecha de inicio y finalización del proyecto:
 Cambios en la fecha de inicio y finalización:
 periodo que cubre el informe: 30 DE ABRIL2013\30 DE SEPTIEMBRE 2013

N° de Beneficiario	Hombres: 15	Mujeres: 13
	Niños: 4	Niñas: 7

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$23,419.50
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢10.302.115
Fondos gastados PPD hasta la fecha	¢10.302.115
Balance	¢1.163.155
Desembolso solicitado al PPD	<i>\$ 2342.78</i>

Informe Hecho por:
 Nombre: Wenyuri Porras Chavarria
 Cargo: Secretaria
 Firma: *Wenyuri Pch. 6393217*
 Fecha:
 Para uso del PPD:

Fecha recibido: <u>EDUARDO MATA</u>	Cargo: <u>CN.</u>
Revisado por: <u>Eduardo Mata</u>	Fecha revisado: <u>2-10-2013</u>
Firma: <u>Fecha: 2/10/2013</u>	

INFORME NARRATIVO:

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1 Objetivos principales

- 1) Acondicionar un mariposario para la venta de pupas y recibo de visitantes
- 2) Generar facilidades para la recepción de turismo que ingresa a Corcovado por Los Patos
- 3) Fortalecer las capacidades y conocimientos de las integrantes de la asociación para la recepción de turistas. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de la comunidad de Guadalupe de La Palma, mediante la implementación de iniciativas socio productivas.

Actividades planificadas

Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Actividades para acondicionar el mariposario para la venta de pupas y recibo de visitantes:

- 1.1 Compra de sarán, tubos galvanizados, cemento, arena, varilla de construcción. Esto para la construcción de las jaulas.
- 1.2 Recolección de plantas y semillas, elaboración de estantes para colocar plantas enriquecidas, preparación de compost y fertilizante para obtener plantas enriquecidas para producir pupas de calidad. Esto para la construcción del vivero.
- 1.3 Compra de materiales, cemento, madera, zinc, cielorraso, arena, cable para electricidad, alambre de construcción, tornillos para techo, maya galvanizada, cedazo. Esto para la construcción del laboratorio.
- 1.4 Compra de herramientas para el trabajo del grupo de mujeres: palas, carretillo, cuchillos, rastrillos, manguera, bomba carpí, guaraña.

Actividades para generar facilidades para la recepción de turismo que ingresa a Corcovado por Los Patos:

- 2.1. Compra de materiales: madera para la plataforma, compra de lonas, tiendas para acampar, colchones, tela para las sobrecamas y cobijas, toallas
- 2.2. Elaboración de la plataforma.
- 2.3 Compra de materiales; cemento, servicios sanitarios, varillas de construcción, lavamanos, láminas de zinc, cerámica, construcción de servicios sanitarios.
- 2.4. Compra de materiales y utensilios para la cocina, construcción del rancho para brindar los servicios

Actividades para fortalecer las capacidades y conocimientos de las integrantes de la Asociación Avancemos, para la recepción de turismo acorde a los estándares de calidad:

- 3.1. Organizar y solicitar los cursos y capacitaciones; administración de empresas, servicio al cliente, cocina criolla, producción y comercialización de pupas de mariposas, manipulación de alimentos.
- 3.2. Participar en las capacitaciones

3 Actividades realizadas:

En la segunda etapa del proyecto se terminaron algunos detalles del laboratorio tales canoas, cedazo antinsectos, elaboración de larvarios.

Compra de materiales para las jaulas de vuelo.

Construcción de las jaulas de vuelo. se hicieron zanjo, se armaron las estructuras luego se comenzó a pegar las dos filas de block, cuando se termino la soldadura, se pinto toda la estructura se tomaron las medidas se corto el sarán y se coció todavía no se ha colocado porque estamos a la espera de los permisos de funcionamiento como mariposario para colocar el sarán en las dos estructuras.

Se trasladaron los arboles del vivero forestal y se reubicaron en un espacio del mariposario,

En el mes de septiembre se terminaron de sacar los permisos en la municipalidad y de inmediato se comenzó con la construcción del rancho, hasta el momento se han hecho actividades como: Zanjar, armar estructura hacer mezcla, pegar block, sisar, rellenar el block, armar la viga corona y las vasas, además de chorrearlas y rellenar para chorrear el piso, colocar los postes de madera.

Ya el plan de manejo está en las oficinas del minaet de puerto Jiménez con todos los documentos correspondientes estamos a la espera de la visita para la inspección del laboratorio como último requisito para que nos otorguen los permisos de funcionamiento como mariposario de venta y exhibición.

4. PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

El mayor problema ha sido la lentitud en la municipalidad de Golfito para gestionar los tramites de permisos de construcción se invirtió mucho dinero en viajes a la municipalidad debido a la gran cantidad de requisitos que exigen para otorgar los permisos de construcción.

Otro de los problemas que tuvimos fue que hubo que modificar el presupuesto ya que el presupuesto destinado a las jaulas de vuelo se estaba superando por los altos precios de los materiales y la mano de obra como soldadura,

Además se pensaba construir una plataforma para la cual se contaba con la madera donada por minaet, dicha plataforma no se pudo construir porque en minaet no fue posible de ninguna forma que nos donaran la madera necesaria para la construcción de esta plataforma para campin sin embargo hay unos postes que se habían comprado los cuales son un avance para poder construir ya no una plataforma sino un albergue de forma mas segura para los visitantes en el futuro.

6 Información adicional

La asociación trabaja en un proyecto de bienestar socio ambiental el cual consiste en sembrar árboles para reforestar las orilla del rio rincón se han sembrado con la ayuda del IMAS 1500 árboles de sota caballo en zonas estratégicas para prevenir en un futuro el impacto en las tierras colindantes al rio ya que el sota

caballo sostiene la tierra y evita en gran medida la erosión que causa el río al crecer, además estos árboles ayudarán a la reconstrucción biológica de estas zonas que tienen poca vegetación.


El señor Guillermo Fernández vecino de la comunidad donó un árbol para la formaleta del rancho y la asociación solo pagó parte del aserrío de este árbol esta colaboración significó un ahorro de 150 mil colones ya que se sacaron 300 pulgadas de madera.

Por otra parte el ministerio de trabajo nos aprobó el proyecto y nos está ayudando por dos meses con el programa de subsidio de trabajo temporal con este subsidio los jefes de familias han podido ayudar en el proyecto sin dejar desatendidas sus familias ya que el ministerio les paga 160 horas mensuales un total de 170 mil colones. ✓

TRABAJO EN LAS JAULAS DE VUELO





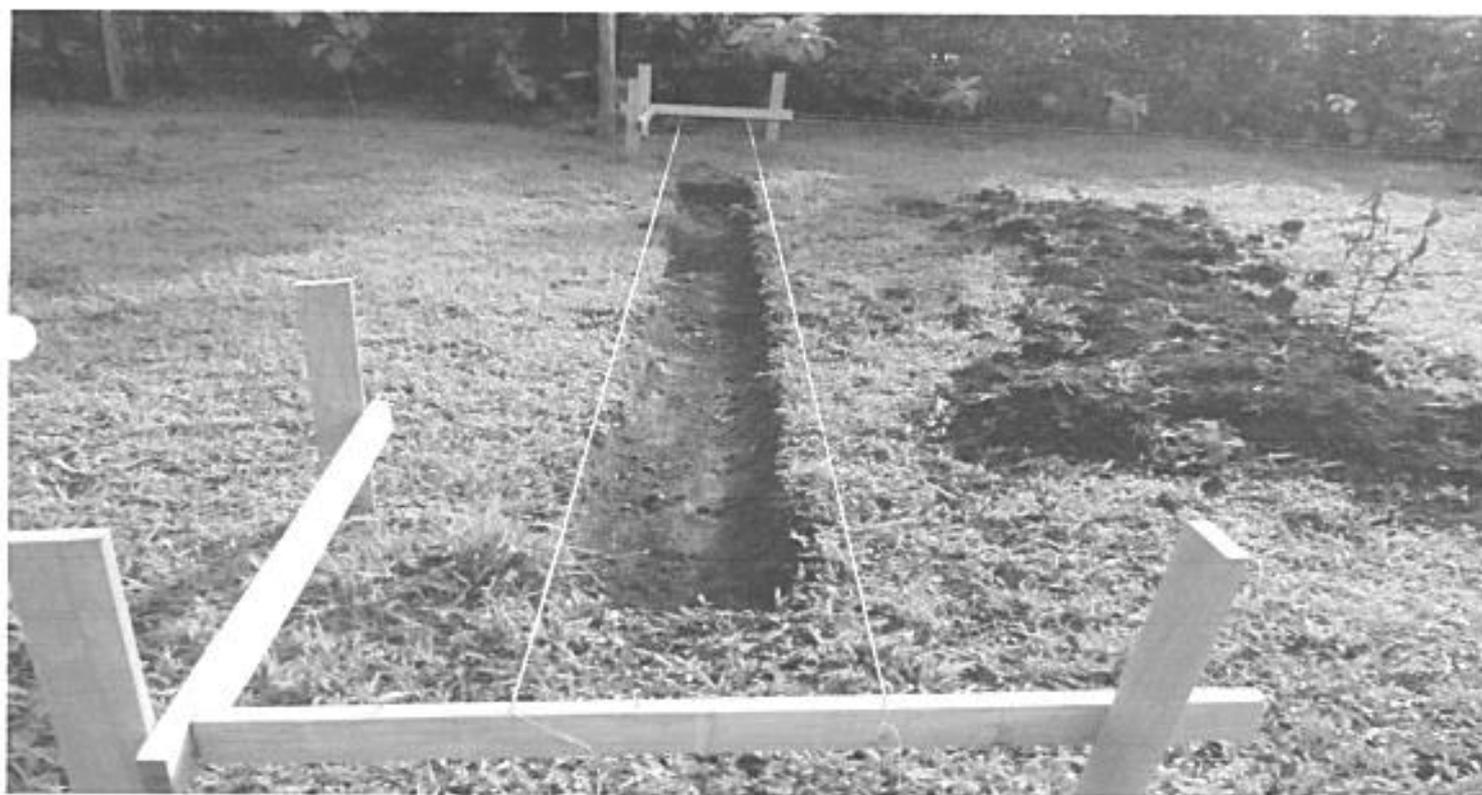

















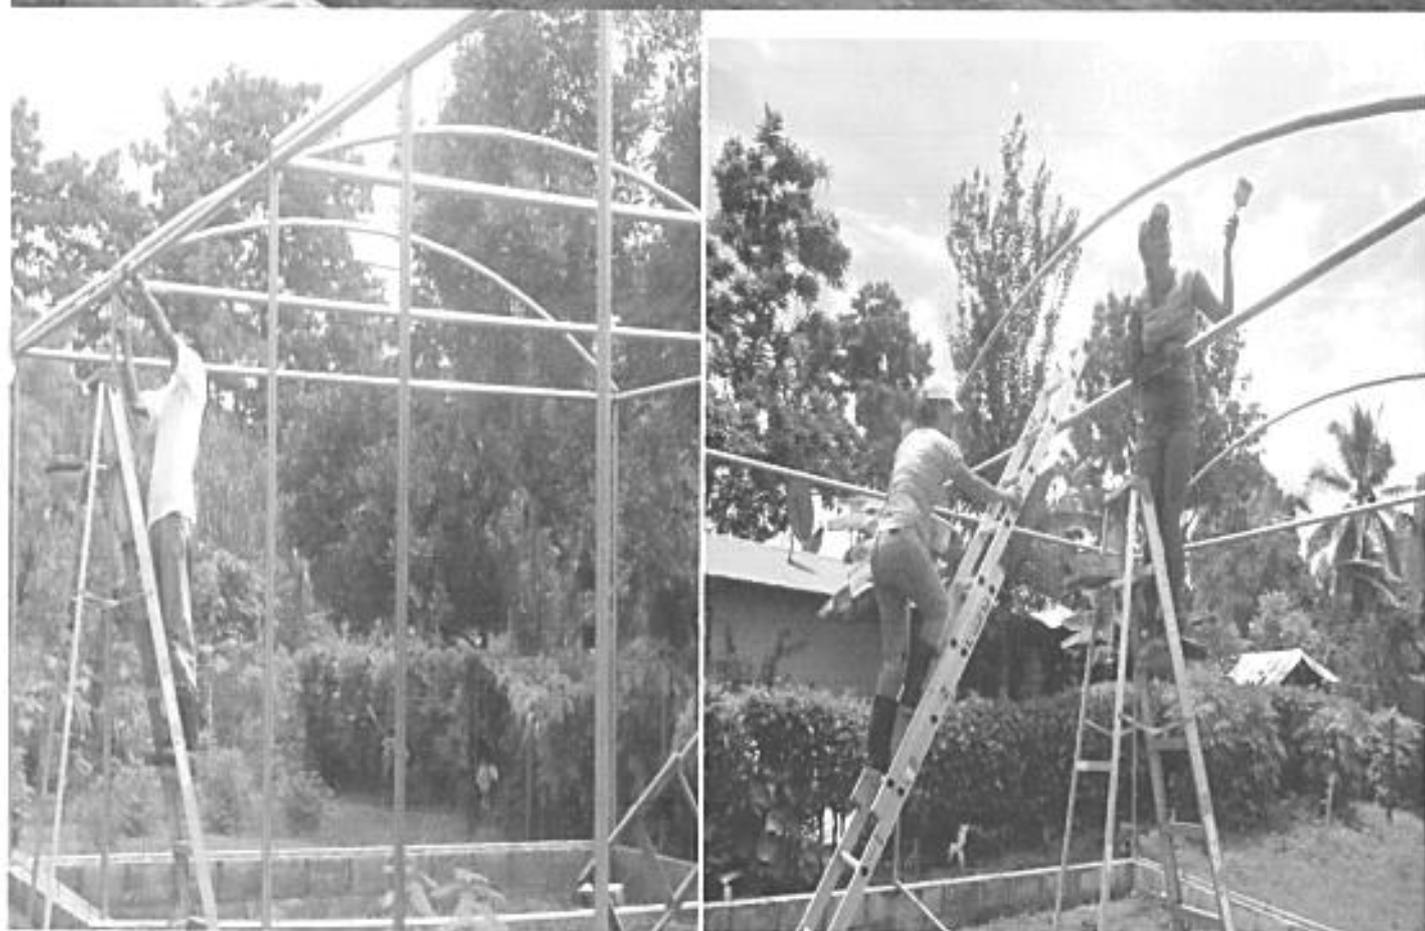






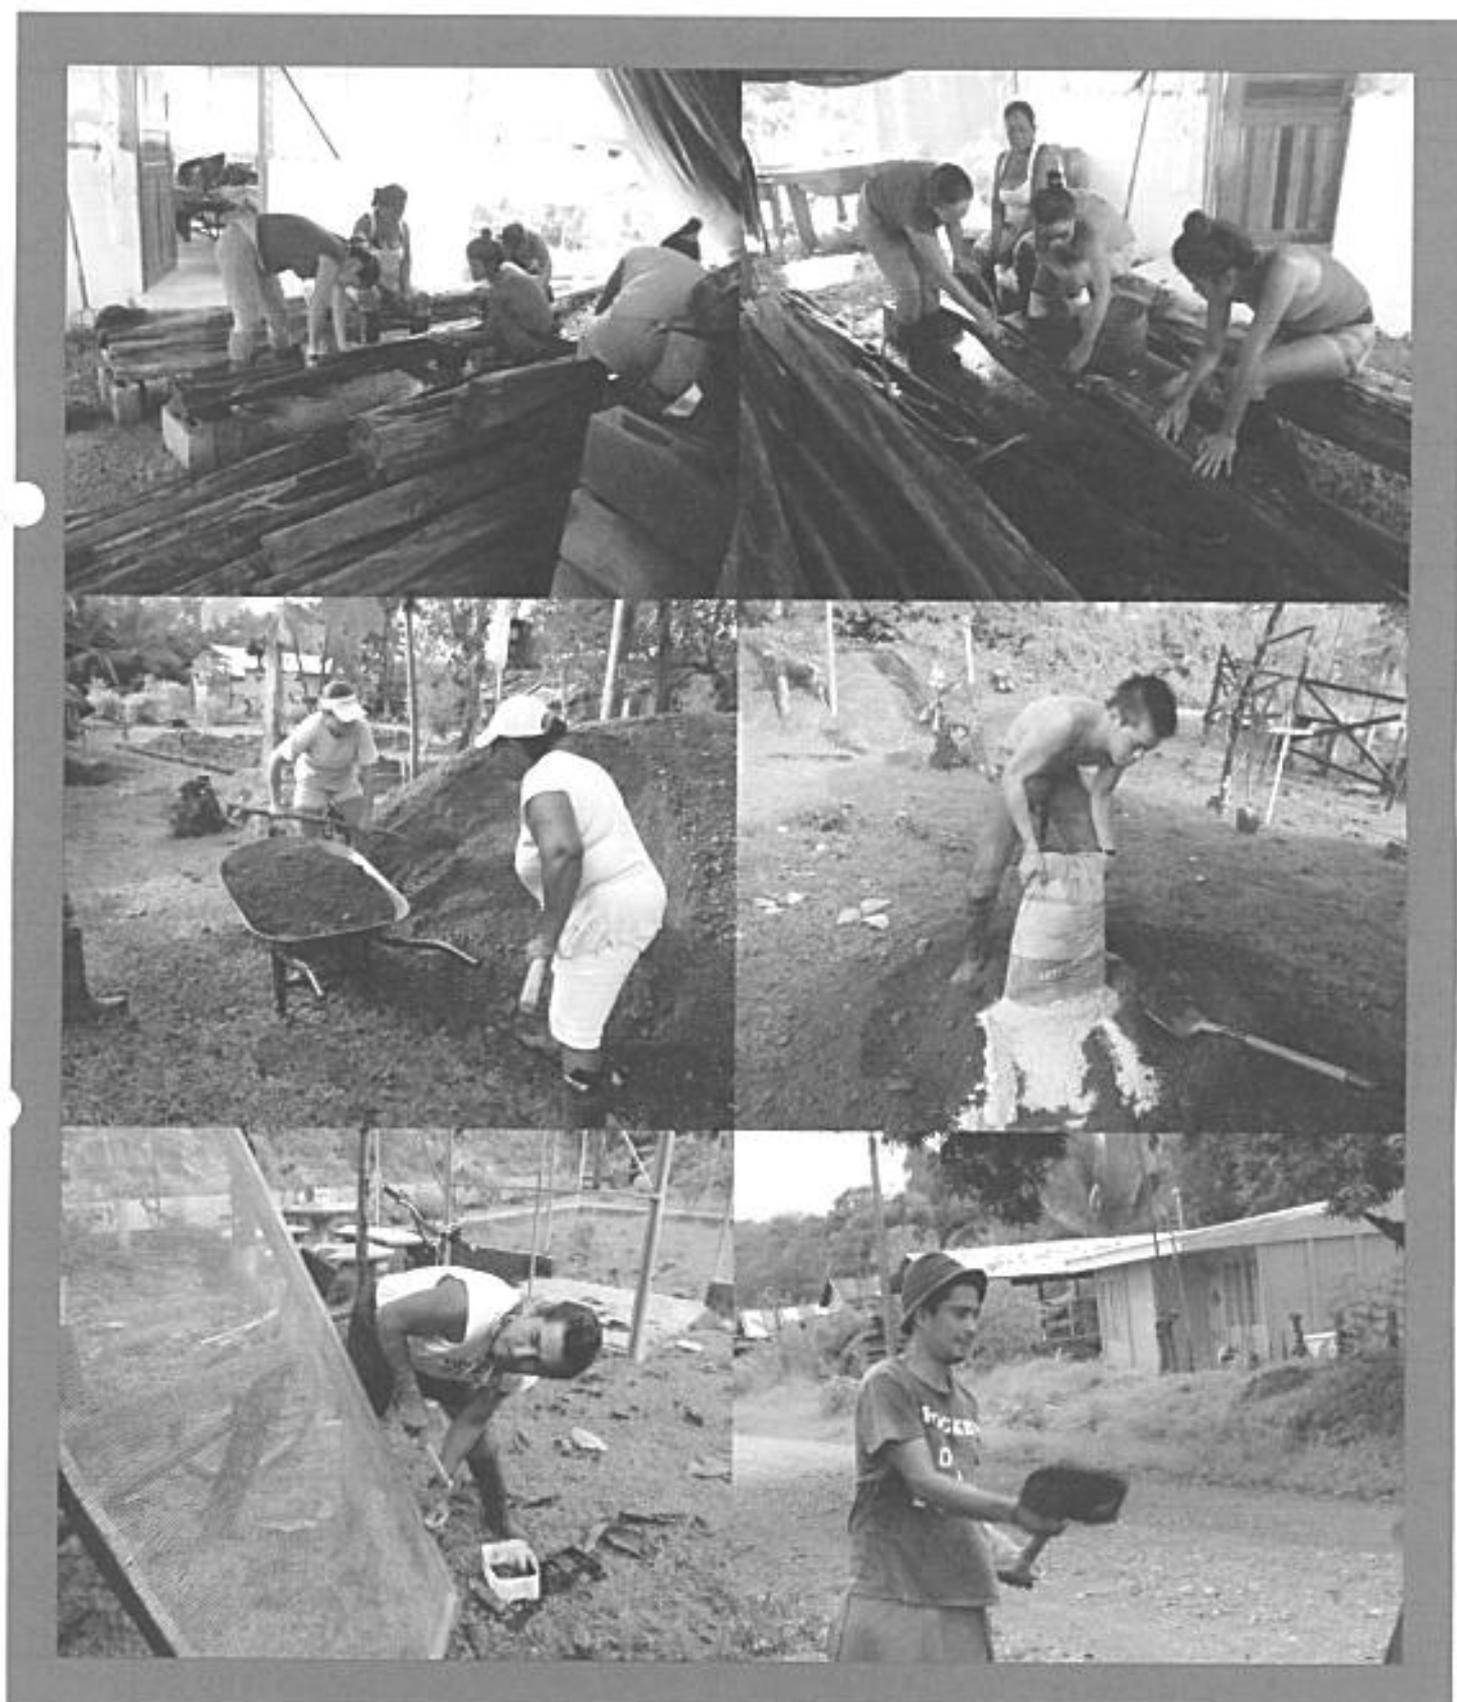

Construcción del rancho

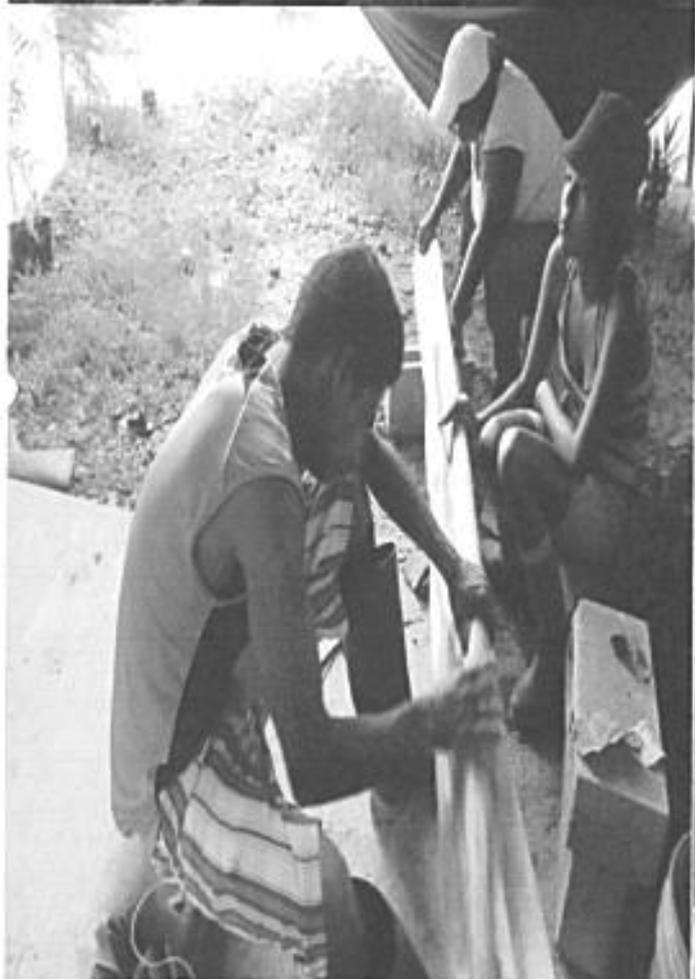














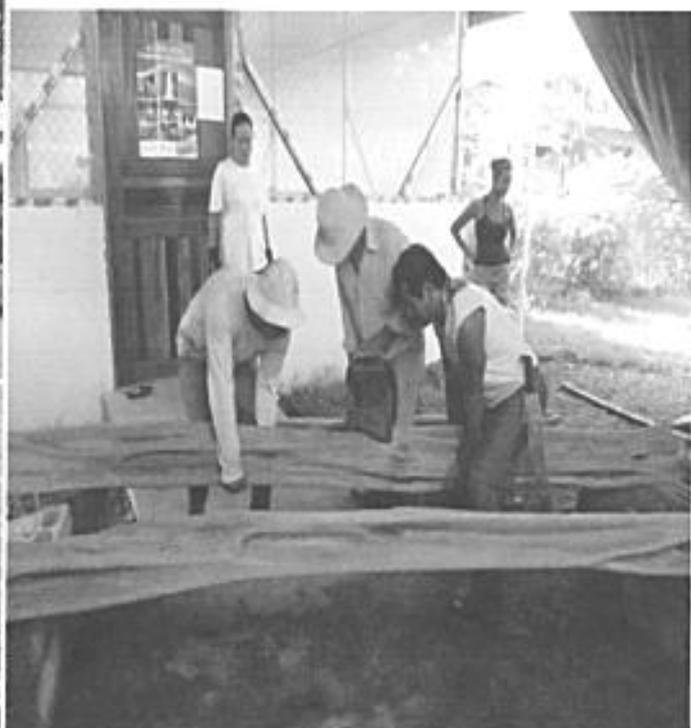



Siembra de arboles











Visita de doña Sonia Sánchez ministerio de trabajo



Aserrió de madera donada por don Guillermo Fernández

